

# 人大ボウル一体型でエプロン、高いバックガードの天板の手洗い製作について

今回の依頼はボウルが ABC 商会 Round-M でエプロンとバックガードの高さを高めに製作し、すべて一体型として持ち込み施工するものです。



また、仕様、確定図は下記のようにになりました。

### \*\*\*仕様\*\*\*

- 天板: コーリヤン ベナロ ヒスク t12.3
- ボウル: ABC商会 Round-M カモホワイト
- 水栓: ケロエ HG34130 取り付け穴φ30、締め付けtMax40
- 排水: ストラップ

天袋 扉、外装: ウルタン塗り潰し G25-90A、50%艶消し  
 下部収納 前板、扉: サマリ無垢柵目横目 反り防止取り付け  
 外装: サマリ柵目横目突板 オイル仕上げ

内装: #95414 (天袋、下部収納共通)  
 天袋: タンパ-式  
 下部収納手掛け: 彫り手  
 引き出し: 普通3段スライドレール

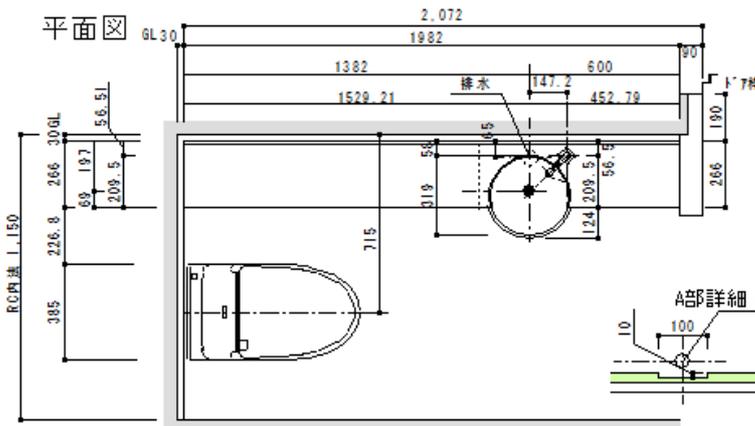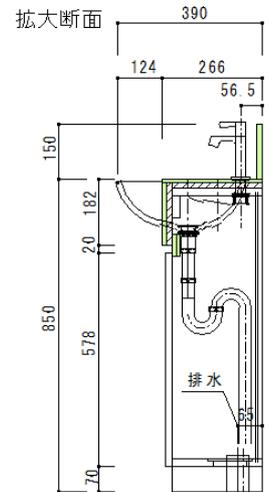

## 確定図 地階手洗い 外装図


三好様承認 S=1/15

\*\*\*仕様\*\*\*  
 天板: コーリヤン ベナロ ヒスク t12.3  
 ボウル: ABC商会 Round-M カモホワイト  
 変更 水栓: ケロエ HG34130 取り付け穴φ30、締め付けtMax40  
 排水: ストラップ

天袋 扉、外装: ウルタン塗り潰し G25-90A、50%艶消し  
 下部収納 前板、扉: サマリ無垢柵目横目 反り防止取り付け  
 外装: サマリ柵目横目突板 オイル仕上げ



内装: #95414 (天袋、下部収納共通)  
 天袋: タンパ-式  
 下部収納手掛け: 彫り手  
 引き出し: 普通3段スライドレール

### 断面図

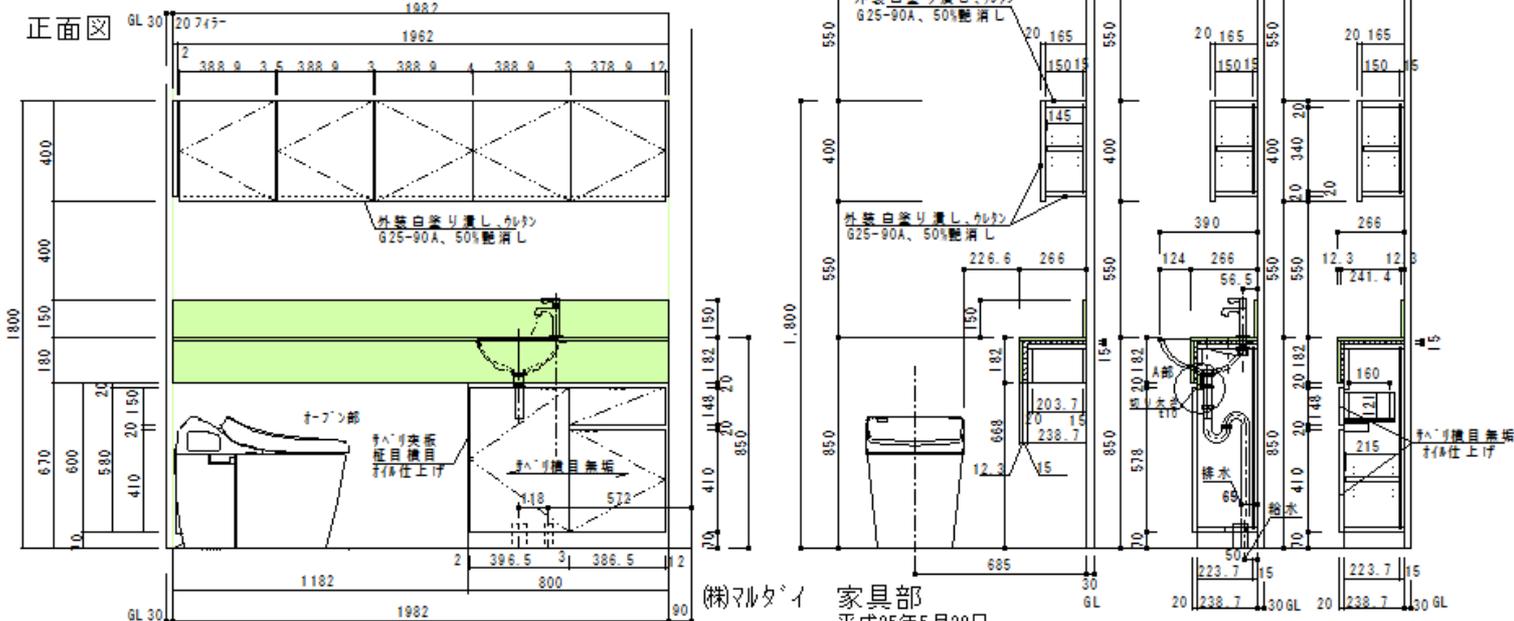


(株)マルタダイ 家具部 平成25年5月20日

確定図 地階手洗い 内装図

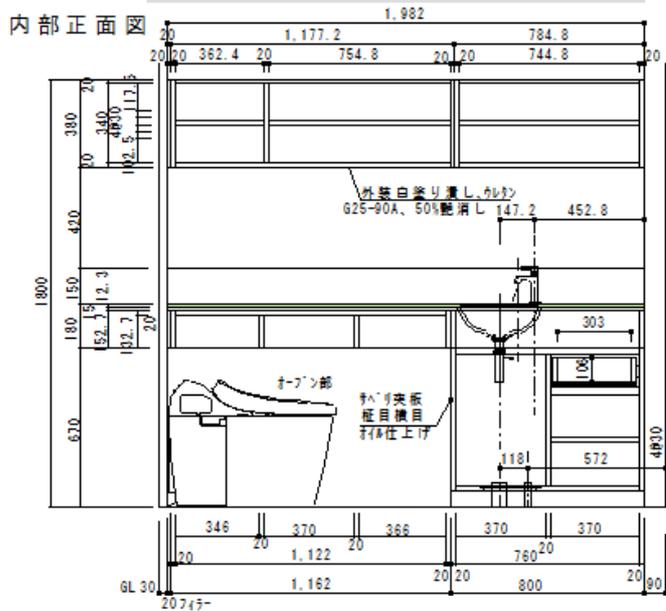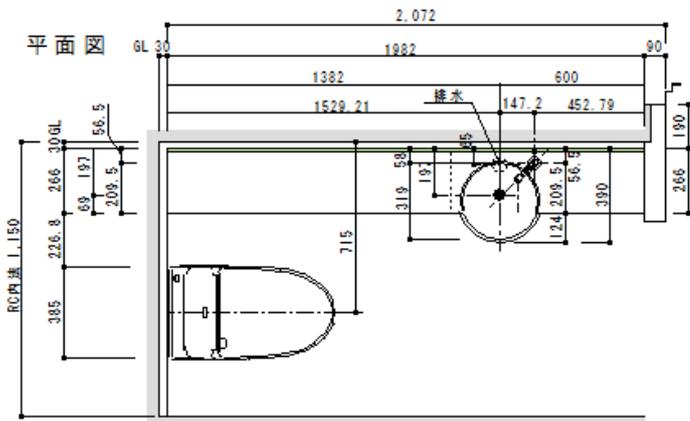

\*\*\*仕様\*\*\* S=1/15 三好様承認  
 天板: コーリン ベナロ ビスク t12.3  
 材割: ABC商会 Round-M 材林ワト  
 変更 水栓: カノエ HG34130 取り付け穴φ30、締め付けtMax40  
 排水: ストラップ  
 天袋 扉、外装: 白塗り濃し、丸サ 625-90A、50%艶消し  
 下部収納 前板、扉: 白塗り無垢珪目黒目 反り防止取り付け  
 外装: 白塗り珪目黒目突板 扉仕上げ  
 内装: 白塗り5414 (天袋、下部収納共通)  
 天袋: タンパ式  
 下部収納手掛け: 彫り手  
 引き出し: 普通3段タイプレベル

断面図

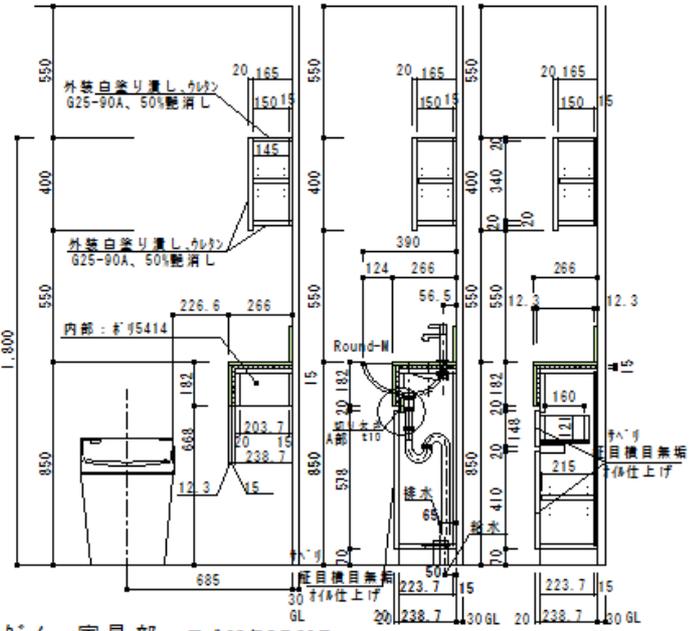


株式会社 家具部 平成25年5月20日

1. RC 構造での壁固定準備。



GL30 仕上げのため、家具の壁固定が出来なくなり  
 あらかじめ天袋部、カウンター部の位置に t24 合板  
 を壁固定し、その合板に家具を固定する。

## 2. 家具組立。

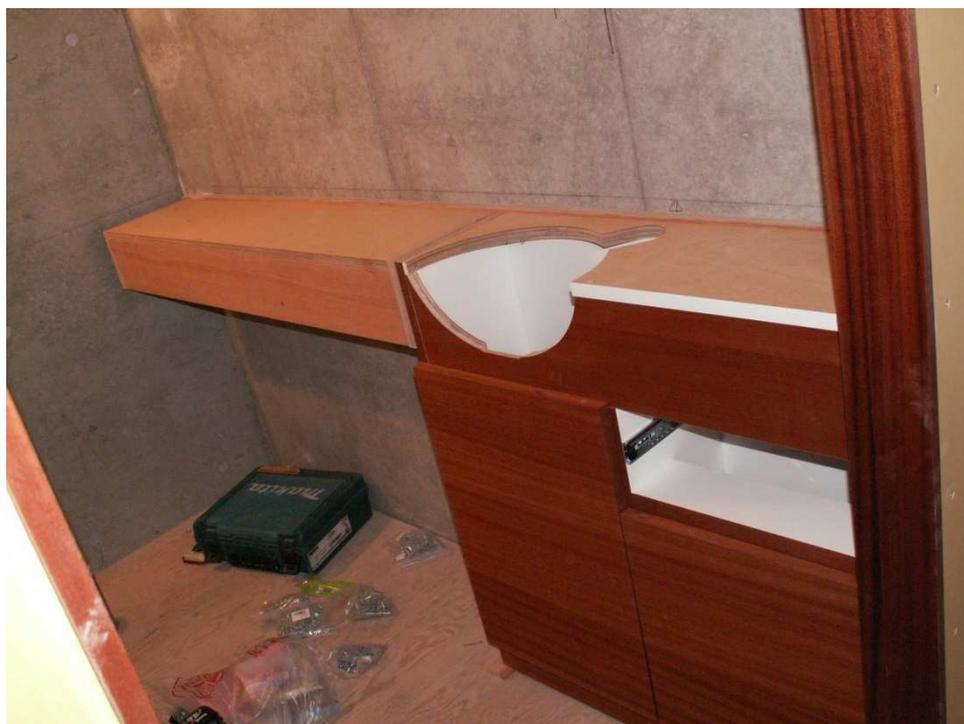

GL 施工前に取り付けとなり、カウンター部の人大天板受け箱を壁固定する。



ボウル、エプロン、バックガードの一体型人大を受け箱に被せる。  
そして、カウンター部、天袋部を組み上げて、GL 工事を行う。

### 3. 調整。

GLを終えて、塗り壁工事完了後、扉、引き出しの調整を行う。




反り防止材にてフラットに扉を調整。

扉はサペリの柾目無垢剥ぎ板横目です。



扉、引き出し開放状況。

#### 4. 仕上がり状況。

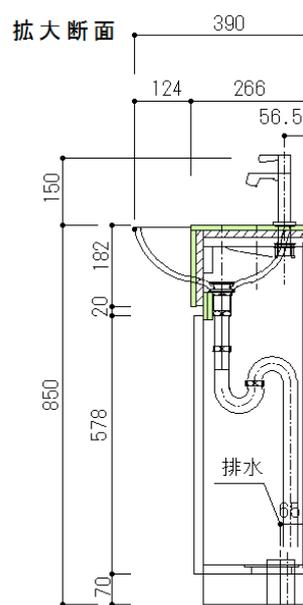

手洗い天板奥行 300 以下 250 までならば  
φ300 ボウル部のみ迫り出した形状はどう  
でしょうか。

また、ボウル、天板の人は色柄を変えら  
れますので、カラフルな遊び心も楽しめま  
す。

(株)マルダイ 家具部 Da・Monde 鈴木  
平成 26 年 1 月 6 日
